

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Ingeniería en Software

Grupo: 6A

Proyecto:

NutriVisionAI

Docente:

Ruth Aivi Chávez Rodríguez

Nombre de los estudiantes:

Mariam Getzamaret Gómez Renteria

Francisco Javier Martínez García

Erick Martínez Rocha

Juan Antonio Castañuela Carlos

Jesús Manuel Cornejo Rangel

Nombre del equipo o proyecto: NutriVision AI

Periodo: 18 de mayo – 4 de junio de 2026

Objetivo del Sprint:

El Sprint 5 cierra el ciclo de desarrollo del proyecto NutriVision AI con una iteración ágil de cambio. El propósito no es construir funcionalidades nuevas desde cero, sino demostrar que el equipo puede recibir retroalimentación externa real, transformarla en una mejora implementable, desarrollarla con orden y evidencia, y presentar una versión final del sistema que sea transferible, mantenible y defendible como entrega profesional de Ingeniería de Software.

La pregunta central del sprint es: ¿El equipo sabe responder a un cambio real, implementar una mejora con ingenio y cerrar un producto defendible?

Roles y Responsables:

- Francisco Javier Martínez García — Coordinador (feature-coordinador)
- Erick Martínez Rocha — Analista (feature-analista)
- Juan Antonio Castañuela Carlos — Diseñador UX/UI (feature-diseno)
- Jesús Manuel Cornejo Rangel — QA / Tester (feature-qa)
- Mariam Getzamaret Gómez Renteria — Desarrolladora (feature-dev)

Decisiones Tomadas:

- **Mejora externa obligatoria:** Tras la revisión con el docente externo, el equipo recibió múltiples observaciones sobre la experiencia del usuario: ausencia de pantalla de bienvenida, falta de confirmaciones visuales al autenticarse y crear perfil, poca interactividad general, uso de terminología técnica sin contexto y ausencia de indicadores de carga. Dado que varias observaciones apuntaban a la necesidad de hacer la app más informativa e interactiva, el equipo definió como mejora concreta y viable para el sprint el **análisis de ingredientes del platillo escaneado**, que amplía la retroalimentación que el sistema entrega al usuario tras cada escaneo. Esta decisión conserva la intención central de la retroalimentación y se ajusta al tiempo disponible del sprint.
- **Análisis de impacto previo a la implementación:** El Analista (Erick) fue responsable de documentar el análisis de impacto antes de que la Desarrolladora iniciara cualquier cambio en el código, identificando las áreas afectadas: el servicio de

Gemini, la pantalla de resultado del escaneo y la base de datos local. Esto evitó modificaciones impulsivas y garantizó trazabilidad del cambio.

- **Distribución del trabajo por ramas:** Se mantuvo la disciplina de trabajo por ramas de rol. Cada integrante trabajó en su rama correspondiente (feature-analista, feature-diseno, feature-dev, feature-qa, feature-coordinador) y realizó Pull Requests hacia la rama desarrollo. La rama main se reservó únicamente para la liberación final validada al cierre del sprint.
- **Pruebas de no regresión:** El QA (Jesús) fue responsable de verificar que la mejora implementada no rompiera ninguno de los flujos existentes del sistema, en particular el flujo de escaneo, el historial de registros y el dashboard. Los casos de prueba y sus resultados quedaron documentados en test_report_sprint5.md.
- **Actualización del README:** La Desarrolladora (Mariam) fue responsable de mantener el README actualizado con el estado final del sistema, incluyendo instrucciones claras de instalación, configuración del entorno y ejecución, para que otro equipo pudiera clonar y correr el proyecto de forma independiente sin intervención del equipo original.
- **Preparación de la presentación final:** El Coordinador (Francisco) coordinó la elaboración del apoyo visual con un máximo de 7 diapositivas, asegurando participación distribuida entre todos los roles. Cada integrante aportó el contenido correspondiente a su responsabilidad, evitando que la presentación recayera únicamente en el Coordinador o el Diseñador.

Actividades Realizadas:

- **18 de mayo (Inicio del Sprint 5 — Semana 1):** El Coordinador (Francisco) creó el tablero del Sprint 5 en Trello, generó las tarjetas por rol y asignó fechas límite a cada responsabilidad.
- **19 de mayo:** El equipo se reunió para acudir con el docente externo asignado. Se presentó brevemente el sistema en su estado actual (Sprint 4) y se recibió la observación formal.
- **19 de mayo:** El Analista (Erick) registró formalmente la retroalimentación y comenzó la redacción del documento solicitud_mejora_sprint5.md, identificando el problema y definiendo la versión concreta que se implementaría.
- **21 de mayo:** El Coordinador (Francisco) verificó que todos los roles tuvieran tareas asignadas en Trello y que los documentos de la Semana 1 estuvieran en la carpeta docs/ del repositorio en la rama correspondiente.
- **25 de mayo (Inicio de Semana 2 — Implementación):** El Dev Líder (Mariam) inició la implementación de los cambios señalados por el docente, tales como agregar pantallas de bienvenida, implementar RFs, etc.
- **26 de mayo:** Se tomó la decisión de reasignarle la tarea de diseñar el ajuste visual de las pantallas a la Dev Líder (Mariam) ya que el diseñador se atrasó y no se podía avanzar.

- **26 de mayo:** La Dev Líder (Mariam) Subio cambios en el diseño y documentación de los cambios que realizó.
- **27 de mayo:** Se inicio con la elaboración de la bitácora del Sprint 5.
- **27 de mayo:** Se inicio la elaboración del archivo retrospectiva_final.md.
- **27 de mayo:** El QA (Jesus) empezó a revisar y generar observaciones a los archivos subidos al tablero en trello.
- **28 de mayo:** El analista (Erick) subió a trello sus entregables para posteriormente ser revisados por el QA.
- **30 de mayo:** El analista (Erick) hizo los commits a su rama subiendo sus dos entregables.
- **30 de mayo:** El QA (Jesus) Diseñó los casos de prueba con al menos un un caso de error y ejecuto pruebas de no regresión, así mismo redacto su documento test_report_sprint5.md y revisó documentación subida.
- **30 de mayo:** La Dev Líder (Mariam) redactó nota_tecnica_implementacion.md, para posteriormente subirlo a git.
- **31 de mayo:** El QA (Jesus) hizo su commit a la rama feature-qa subiendo el archivo que redactó.
- **31 de mayo:** El coordinador (Francisco) terminó con la redacción de los archivos retrospectiva_final.md y bitácora_sprint5.pdf y posteriormente se subieron a git.
- **31 de mayo:** Se tomó la decisión de reasignarle la tarea de redactar el archivo ajuste_diseno_sprint5.md al coordinador (Francisco).
- **31 de mayo:** El coordinador (Francisco) subió el archivo ajuste_diseno_sprint5.md a github.
- **31 de mayo:** Los integrantes realizaron su respectivo pull request a la rama de desarrollo.
- **31 de mayo:** La Dev Líder (Mariam) checo y acepto pull request de los integrantes.

Evidencias de Trello:

Tablero del Sprint 5: <https://trello.com/b/yUTE1FtZ/nutrivision-ai>

La imagen 1 muestra el tablero en trello con roles y tareas asignadas a cada uno de los integrantes del equipo.

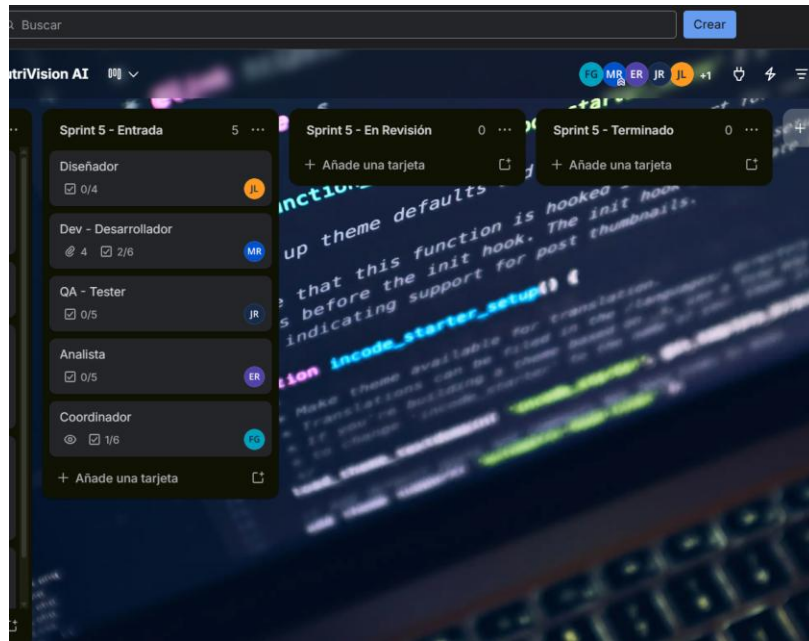


Imagen 1 Tablero de trello con roles y tareas asignadas.

Las Imágenes 2 a 6 muestran las tarjetas correspondientes a cada rol, incluyendo las tareas y actividades asignadas a cada integrante del equipo.

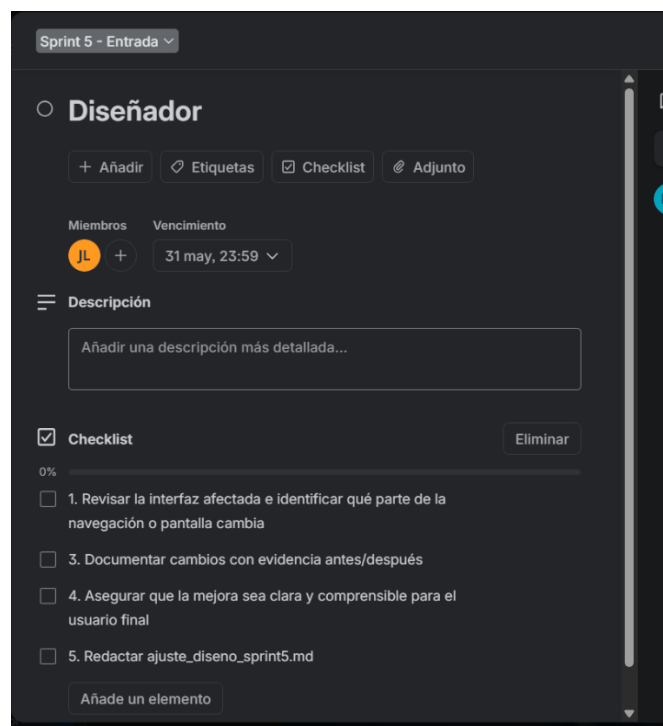


Imagen 2 Tareas asignadas al rol de diseñador.

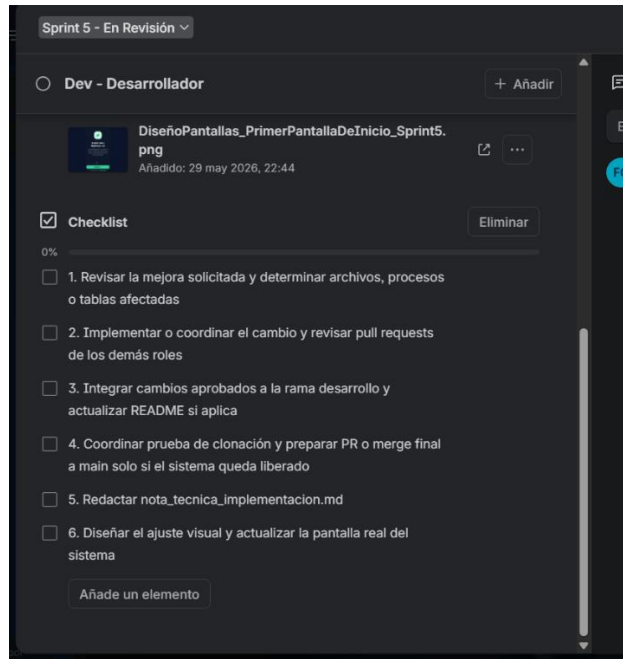


Imagen 3 Tareas asignadas al rol Dev Líder.

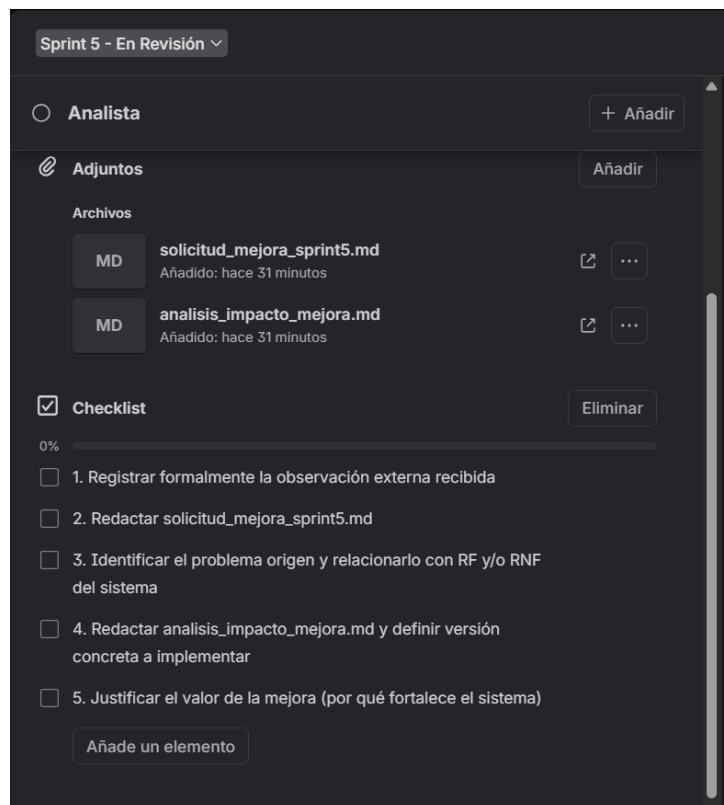


Imagen 4 Tareas asignadas al rol de analista.

Sprint 5 - En Revisión ▾

QA - Tester + Añadir

Descripción

Añadir una descripción más detallada...

☒ Checklist Eliminar

0%

- ☐ 1. Diseñar casos de prueba específicos para la mejora (incluir al menos un caso de error o dato inválido)
- ☐ 2. Ejecutar pruebas de no regresión sobre el flujo principal anterior
- ☐ 3. Documentar resultados: errores encontrados y si la mejora queda funcional o condicionada
- ☐ 4. Apoyar revisión de clonación y confirmar si la versión integrada puede liberarse
- ☐ 5. Redactar test_report_sprint5.md

Añade un elemento

Imagen 5 Tareas asignadas al rol de QA-Tester.

Sprint 5 - Entrada ▾

Coordinador + Añadir

Checklist Eliminar

0%

- ☐ 1. Coordinar visita con docente externo y registrar fecha, nombre y resultado de la retroalimentación
- ☐ 2. Crear y asignar tareas del Sprint 5 en Trello, verificar responsabilidades por rol y registrar avances, bloqueos y decisiones
- ☐ 3. Dar seguimiento continuo para evitar trabajo concentrado al cierre
- ☐ 4. Registrar contingencias, coordinar elaboración del apoyo visual y preparar la presentación final con el equipo
- ☐ 5. Coordinar prueba de clonación, redactar retrospectiva_final.md y verificar que la liberación a main ocurra solo con dictamen favorable
- ☐ 6. Redactar bitacora_sprint5.pdf

Añade un elemento

Imagen 6 Tareas asignadas al rol de coordinador.

A partir de la Imagen 7, se muestran los movimientos y actualizaciones realizados en las actividades asignadas a los integrantes del equipo durante el desarrollo del Sprint.

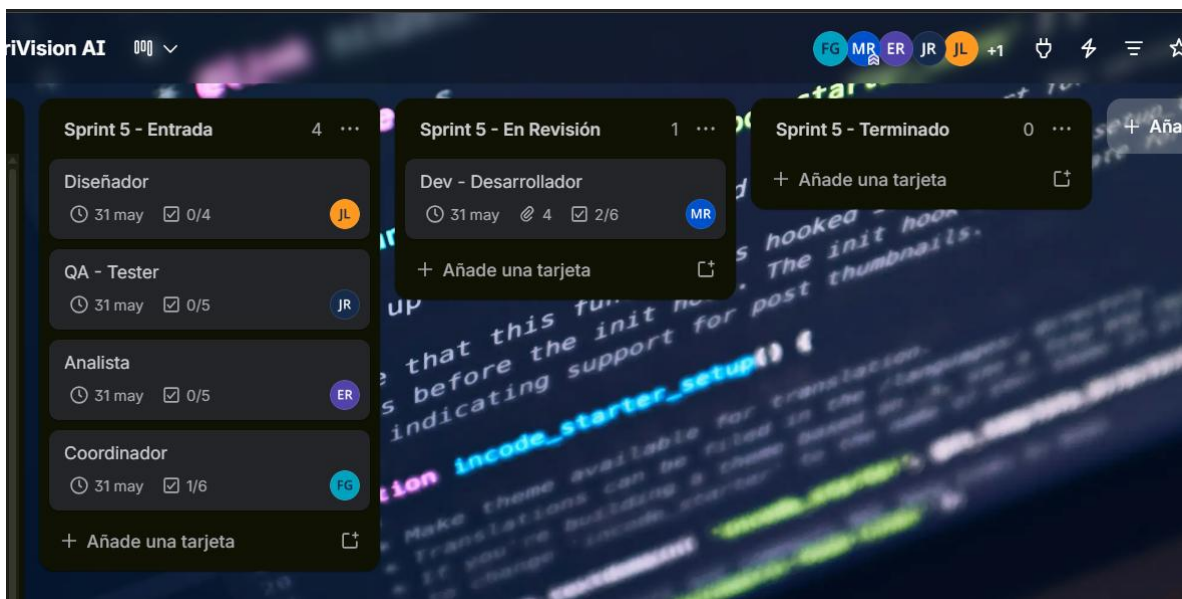


Imagen 7 Tarjeta de Desarrollador movió de estado a "En Revisión".

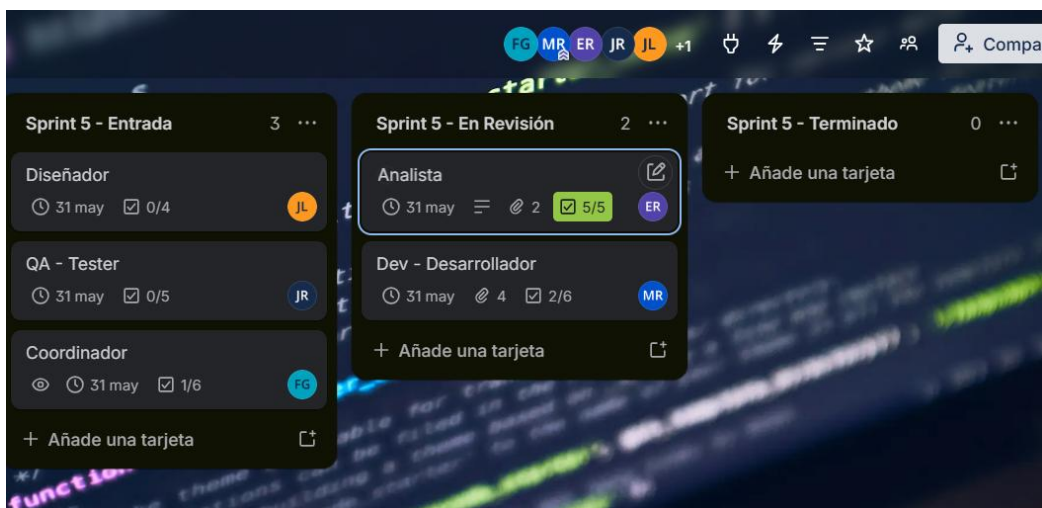


Imagen 8 Tarjeta de Analista paso de estado a "En Revisión".

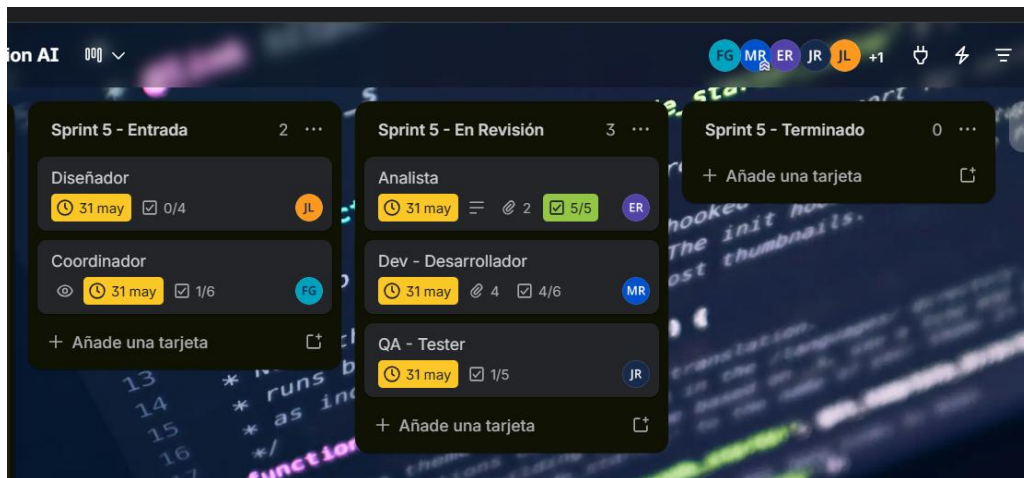


Imagen 9 Tarjeta de Tester pasó al estado "En Revisión".

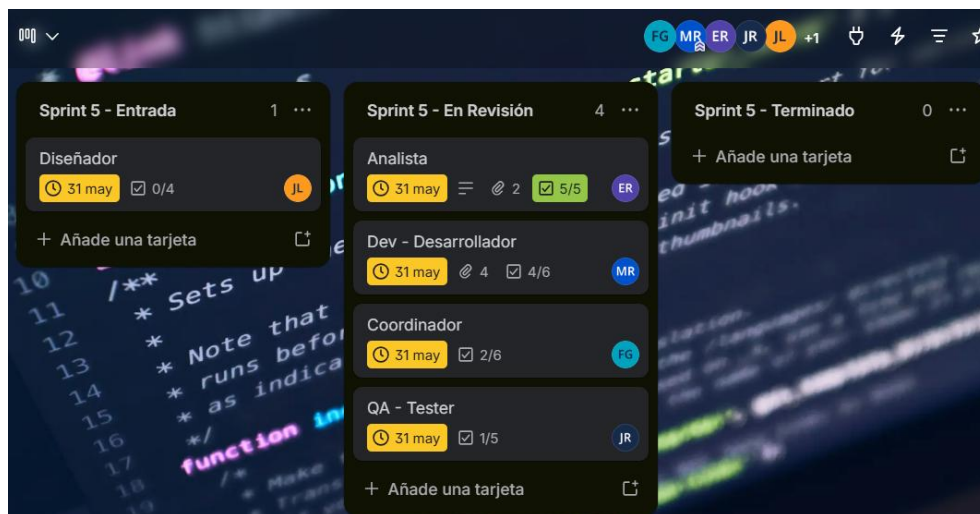


Imagen 10 Tarjeta de coordinador pasó de estado a "En Revisión".

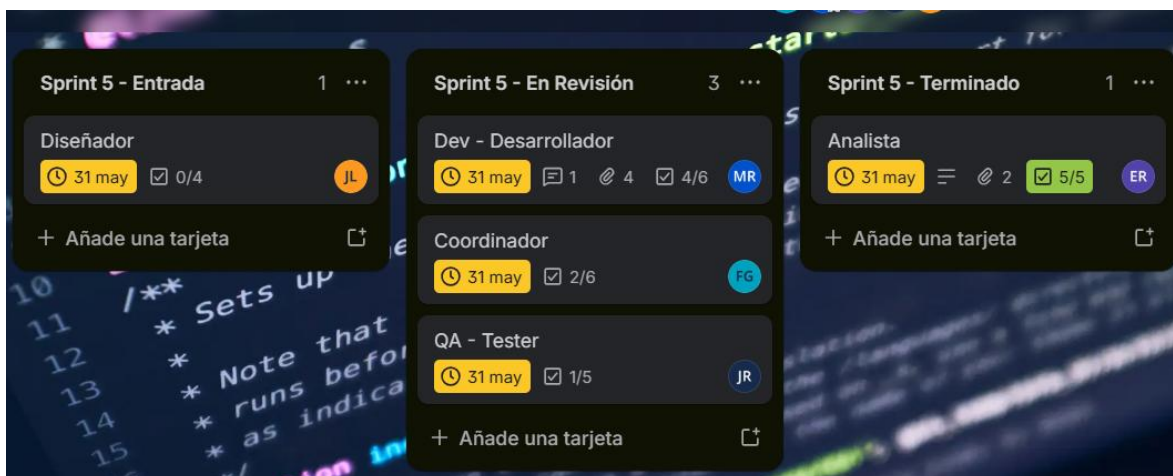


Imagen 11 Tarjeta de analista terminada.

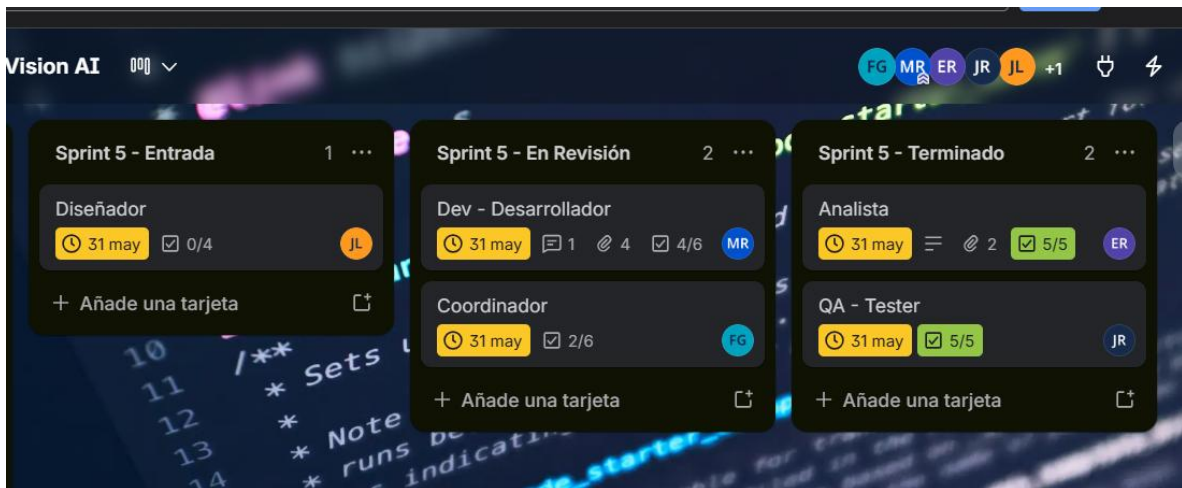


Imagen 12 Tarjeta de QA terminada.

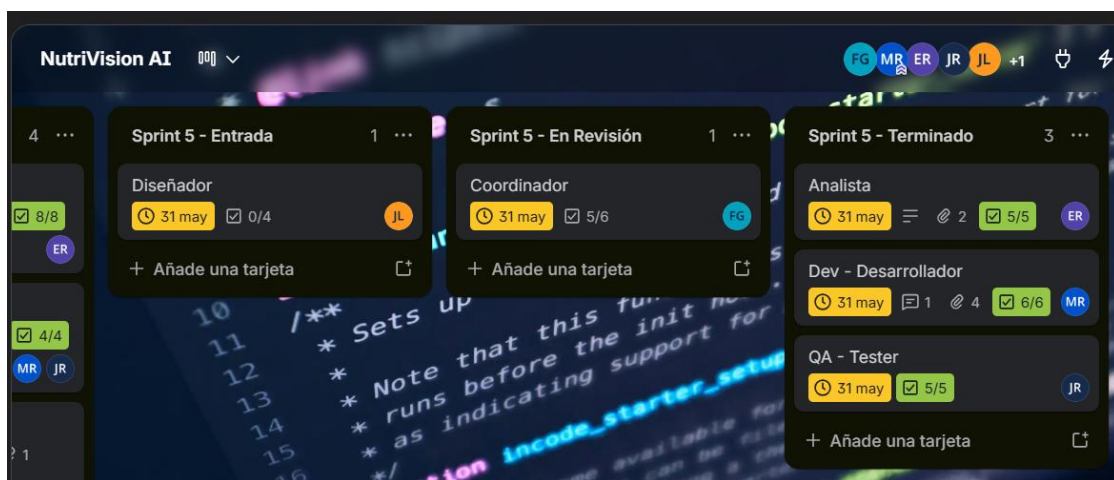


Imagen 13 Tarjeta de Desarrollador terminada.

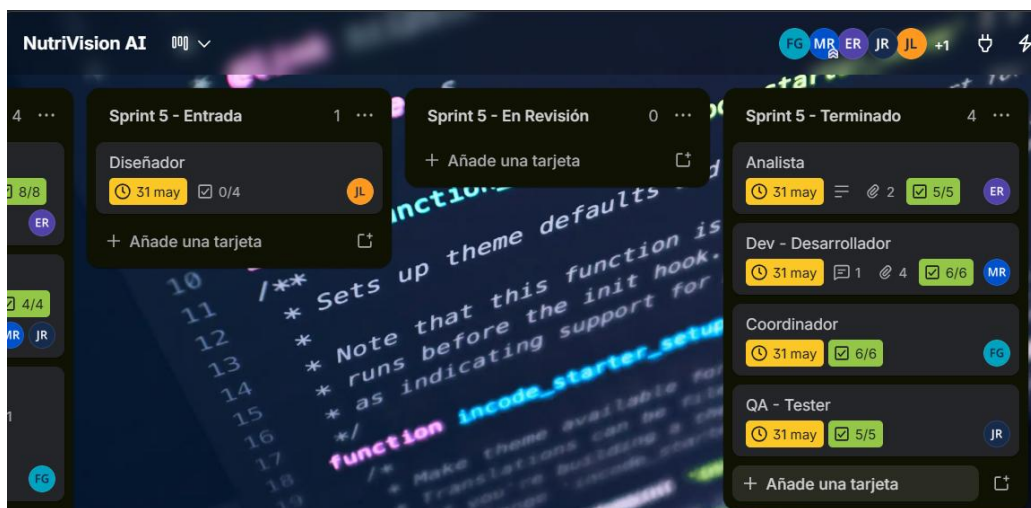


Imagen 14 Tarjeta de coordinador terminada.

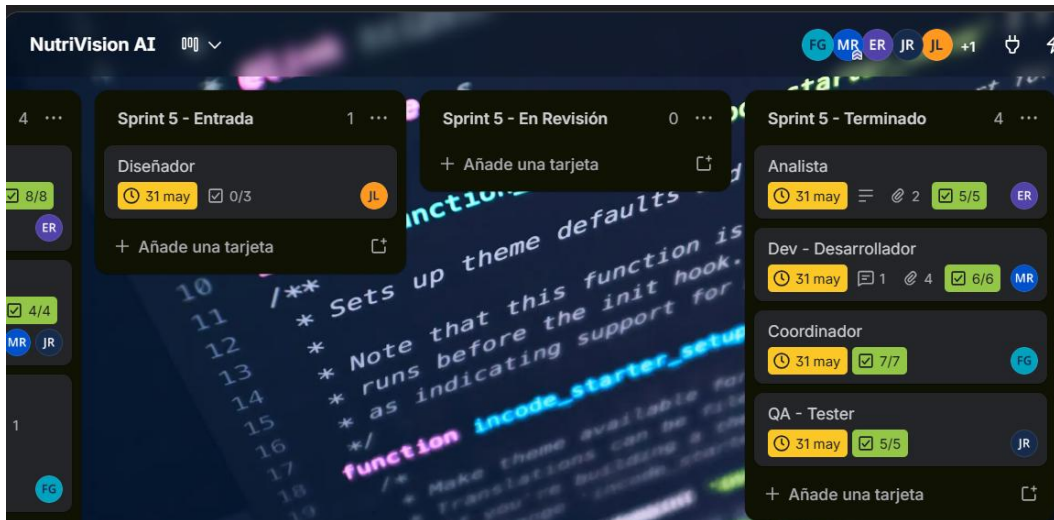


Imagen 15 La tarjeta del diseñador no cambio de estado debido a que se reasigno las tareas a otros roles.

GitHub:

<https://github.com/Hydra115-code/NutriVisionAI>

Rama activa durante el sprint: desarrollo Rama de liberación final: main (solo tras dictamen favorable)
